

概要版

# 山ノ内町 個別施設計画（橋梁） （長寿命化修繕計画）

（第2期）



2024年（令和6年）3月  
（令和6年11月変更）  
山ノ内町

## 山ノ内町 橋梁長寿命化修繕計画 目次


1. 長寿命化修繕計画の目的 .....	- 1 -
2. 計画対象施設 .....	- 3 -
3. 修繕等措置の着手状況.....	- 5 -
4. 個別施設(橋梁)管理の基本的な方針 .....	- 7 -
5. 橋の健全度の把握 .....	- 9 -
6. 対策の優先順位の設定 .....	- 10 -
7. 長寿命化修繕計画による効果 .....	- 11 -

# 1. 長寿命化修繕計画の目的


## (1) 背景

本町が管理し、令和元年度から令和5年度に点検を実施した道路橋は105橋です。  
 一般的に、建設されてから50年以上経過した構造物は、高齢化構造物といわれます。  
 山ノ内町が管理する横断歩道橋は、2024年（令和6年）現在、高齢化構造物は21橋  
 ですが、10年後（2034年）には59橋と急増し、管理橋梁の半数以上になります。

### ●建設後50年以上の道路附属物の推移

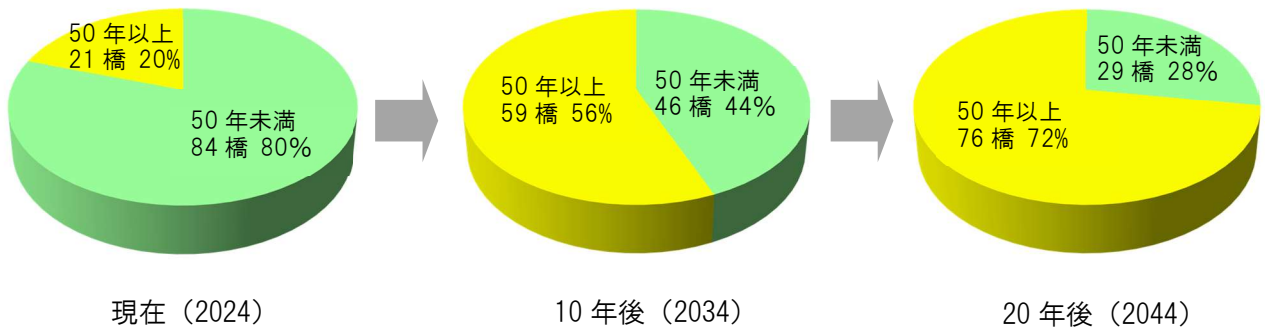


### ●橋長2.0m以上の道路附属物架設年度分布

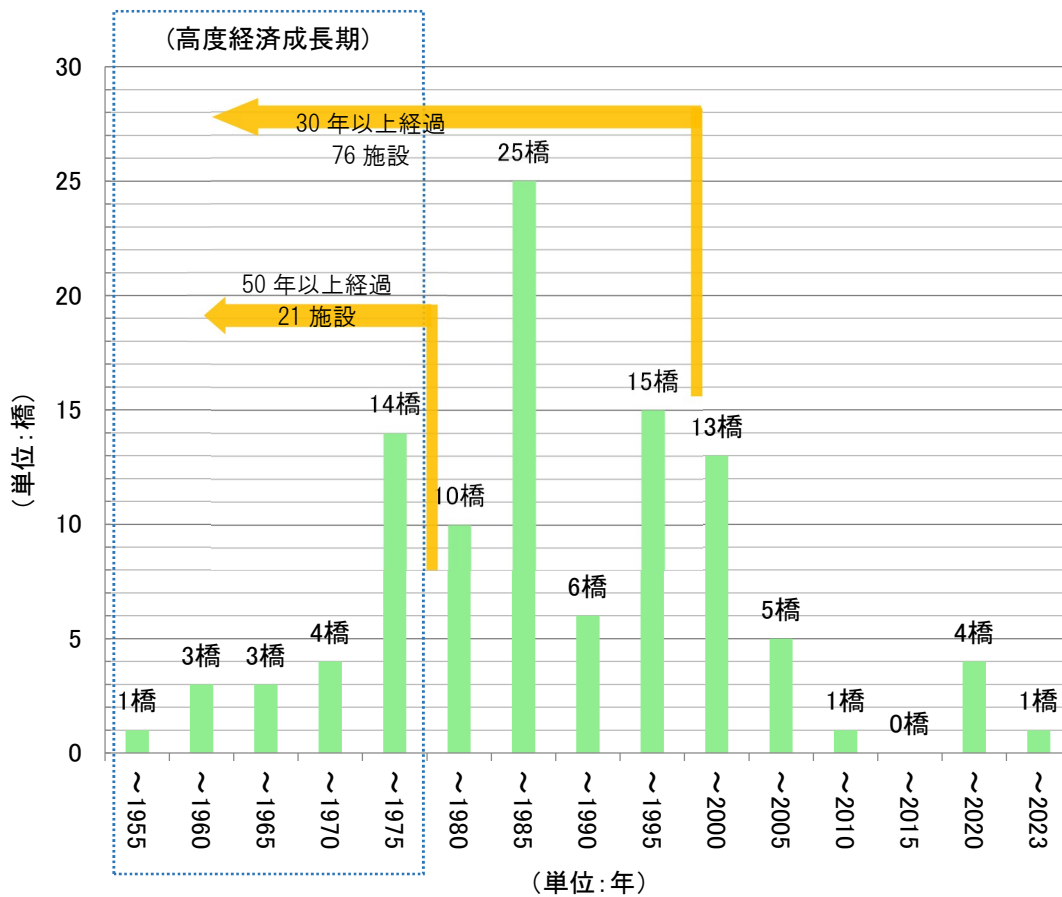

## (2) 目的

既設橋梁の高齢化・老朽化に対し、財政状況に制約があるなかでも効率的かつ合理的に維持管理を実施していくことが強く求められています。

そこで「個別施設長寿命化修繕計画（橋梁長寿命化修繕計画）」の策定により、理想的な維持管理体制の実現を目指します。

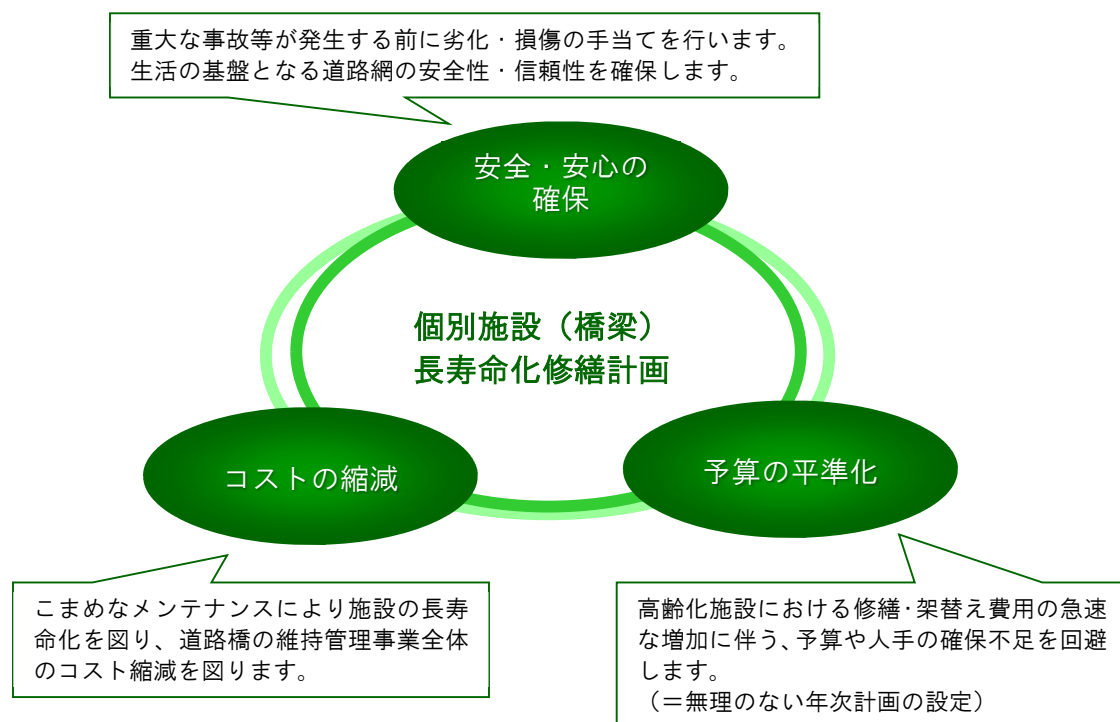

本町では、2020年度（令和2年度）に第1期計画を策定してから、現在に至るまで計画的に維持管理を実施してきました。

本計画では、2019年度（令和元年度）～2023年度（令和5年度）に実施した定期点検結果に基づき、長寿命化を策定します。

## (3) 計画期間

本計画は、2024年度（令和6年度）から2028年度（令和10年度）までの5年間で計画期間として、定期点検計画および個別施設（橋梁）修繕計画を策定します。

## 2. 計画対象施設

本町の管理する橋長2.0m以上の橋梁105橋を計画の対象とします。

以下に計画対象施設一覧を示します。

計画対象橋梁一覧表 (1/3)

NO	橋名	路線		橋長 (m)	全幅員 (m)	径間	橋梁 種別	架設年	交差物件		所在地	措置	直近 定期 点検 年次
		種別	名称										
1	角間橋	町道 1級	宮前角間線	78.3	8.8	4	RC橋	1977	河川	角間川	佐野		2019
2	角間跨道橋	町道 1級	宮前角間線	23.5	11.0	1	RC橋	1995	道路	(名称不明)	佐野		2021
3	1号橋1	町道 2級	湯田中番場沓野線	10.8	7.4	1	RC橋	1973	河川	(名称不明)	平穩		2021
4	2号橋1	町道 1級	湯田中夜間瀬線	4.2	10.7	1	RC橋	2002	河川	(名称不明)	夜間瀬		2023
5	伊沢大橋	町道 1級	伊沢三社線	7.3	5.1	1	RC橋	1975	河川	(名称不明)	戸狩		2020
6	天神橋	町道 1級	伊沢三社線	106.8	8.3	5	RC橋	1974	河川	(名称不明)	戸狩		2020
7	箱山橋	町道 1級	原箱山線	6.8	5.0	1	RC橋	1959	河川	三沢川	戸狩		2019
8	大坂橋	町道 1級	大日堂大坂線	8.0	3.8	1	RC橋	1982	河川	伊沢川	佐野		2023
9	下手橋	町道 1級	中須下手乗廻線	25.6	7.5	1	RC橋	1992	河川	倉下川	夜間瀬		2020
10	向村橋	町道 1級	向村竹の腰線	12.0	5.4	1	RC橋	1982	河川	伊沢川	佐野		2020
11	川原小屋橋	町道 2級	旭山発哺線	13.3	5.2	1	RC橋	1994	河川	(名称不明)	平穩		2021
12	天川橋	町道 2級	横湯天川線	29.4	7.6	1	鋼橋	1977	河川	(名称不明)	平穩		2021
13	一の沢橋	町道 2級	横湯地獄谷線	20.5	6.7	1	PC橋	1981	河川	(名称不明)	平穩		2021
14	2号橋2	町道 2級	横湯地獄谷線	21.9	6.9	3	RC橋	1981	河川	(名称不明)	平穩		2021
15	1号橋2	町道 2級	横湯地獄谷線	2.6	4.6	1	RC橋	1975	道路	(名称不明)	平穩		2021
16	二の沢橋	町道 2級	横湯地獄谷線	6.8	4.8	1	RC橋	1975	河川	二の沢	平穩		2021
17	榎沢橋	町道 2級	金倉安代線	8.9	4.5	1	RC橋	1972	河川	榎沢川	平穩		2021
18	和合橋	町道 2級	湯田中番場沓野線	34.9	6.3	3	RC橋	1949	河川	夜間瀬川	平穩		2019
19	1号橋3	町道 1級	湯田中夜間瀬線	2.0	12.0	1	RC橋	1973	その他	上条堰	平穩		2023
20	栄橋	町道 2級	佐野湯田中線	85.3	6.2	5	PC橋	1960	河川	夜間瀬川	平穩	修繕	2020
21	泡貝橋1号	町道 2級	本郷宇木前坂大廻線	7.7	5.5	1	RC橋	1984	河川	泡貝川	夜間瀬		2020
22	下倉橋	町道 2級	本郷宇木前坂大廻線	5.6	8.4	1	RC橋	1995	河川	笹川	夜間瀬		2020
23	堀橋	町道 2級	宇木深沢線	4.7	5.2	1	RC橋	1964	河川	笹川	夜間瀬		2021
24	かくら橋	町道 2級	天神森林檜線	11.7	5.3	1	RC橋	1978	河川	笹川	夜間瀬		2021
25	不動橋	町道 2級	苗間乗廻線	14.5	8.5	1	RC橋	1993	河川	倉下川	夜間瀬		2021
26	高井富士橋	町道 2級	柏木立がんどう場線	16.5	8.2	1	PC橋	1995	河川	倉下川	夜間瀬		2021
27	中河原橋	町道 2級	中須八丁原線	16.6	4.7	1	鋼橋	1988	河川	白沢川	夜間瀬		2021
28	下白沢橋	町道 2級	表落合池ノ平線	33.2	6.2	2	RC橋	1977	河川	白沢川	夜間瀬	修繕	2019
29	倉下橋	町道 2級	表落合池ノ平線	15.2	5.0	1	鋼橋	1982	河川	倉下川	夜間瀬		2021
30	1号橋4	町道	下手向井線	2.2	3.8	1	RC橋	1979	その他	上条堰	平穩		2019
31	1号橋5	町道	西村線	2.2	3.8	1	RC橋	1973	その他	上条堰	平穩		2019
32	1号橋6	町道	上原川原線	3.1	4.1	1	RC橋	1999	その他	上条堰	平穩		2019
33	1号橋7	町道	湯の原1号線	2.3	5.4	1	RC橋	1973	その他	横堰	平穩		2019
34	2号橋3	町道	湯の原1号線	2.1	5.8	1	RC橋	1973	その他	横堰	平穩		2019
35	1号橋8	町道	湯の原2号線	2.1	4.5	1	RC橋	1974	河川	(名称不明)	平穩		2021
36	安代橋	町道	安代和合橋線	5.5	5.1	1	RC橋	1961	河川	榎沢川	平穩		2021
37	渋湯橋	町道	渋湯1号線	35.6	10.8	2	PC橋	1965	河川	横湯川	平穩		2019
38	地獄橋	町道	上林地獄谷線	9.7	1.5	1	鋼橋(木床版)	2000	河川	(名称不明)	平穩		2021
39	沢尻橋	町道	平床石ノ湯線	5.2	5.4	1	鋼橋(木床版)	1991	河川	(名称不明)	平穩		2022
40	笠見橋	町道	熊の湯山田線	21.0	6.6	1	鋼橋	1966	河川	(名称不明)	平穩	修繕	2020

計画対象橋梁一覧表 (2/3)

NO	橋名	路線		橋長 (m)	全幅員 (m)	径間	橋梁 種別	架設年	交差物件		所在地	措置	直近 定期 点検 年次
		種別	名称										
41	2号橋4	町道	硯川清水線	6.9	1.7	1	鋼橋(木床版)	1984	河川	(名称不明)	平穩		2022
42	3号橋	町道	硯川清水線	8.0	1.9	2	鋼橋(木床版)	2020	河川	(名称不明)	平穩	架替	2023
43	4号橋	町道	硯川清水線	8.0	1.9	2	鋼橋(木床版)	2020	河川	(名称不明)	平穩	架替	2023
44	5号橋	町道	硯川清水線	7.0	1.9	2	鋼橋(木床版)	2020	河川	(名称不明)	平穩	架替	2022
45	6号橋	町道	硯川清水線	6.0	1.9	2	鋼橋(木床版)	2020	河川	(名称不明)	平穩	架替	2023
46	8号橋	町道	硯川清水線	11.5	2.0	1	鋼橋(木床版)	2021	河川	(名称不明)	平穩	架替	2022
47	9号橋	町道	硯川清水線	4.9	1.7	1	鋼橋(木床版)	1991	河川	(名称不明)	平穩		2022
48	10号橋	町道	硯川清水線	7.5	2.0	1	鋼橋(木床版)	2000	河川	(名称不明)	平穩		2023
49	11号橋	町道	硯川清水線	5.0	1.9	1	鋼橋(木床版)	2000	河川	(名称不明)	平穩		2022
50	12号橋	町道	硯川清水線	5.6	1.9	2	鋼橋(木床版)	1991	河川	(名称不明)	平穩		2022
51	13号橋	町道	硯川清水線	10.1	1.6	3	木橋	2000	河川	(名称不明)	平穩		2022
52	14号橋	町道	硯川清水線	5.5	2.0	1	鋼橋(木床版)	2000	河川	(名称不明)	平穩		2022
53	15号橋	町道	硯川清水線	3.1	1.5	1	鋼橋(木床版)	1991	河川	(名称不明)	平穩		2023
54	赤石橋	町道	硯川清水線	16.4	2.0	2	鋼橋(木床版)	1971	河川	(名称不明)	平穩		2022
55	17号橋	町道	硯川清水線	8.0	2.0	1	鋼橋(木床版)	2000	河川	(名称不明)	平穩		2022
56	18号橋	町道	硯川清水線	13.5	1.6	2	鋼橋(木床版)	2000	その他	(名称不明)	平穩		2022
57	19号橋	町道	硯川清水線	11.5	1.9	1	鋼橋(木床版)	2000	その他	(名称不明)	平穩		2022
58	清水橋	町道	硯川清水線	8.0	1.8	1	鋼橋(木床版)	2005	河川	(名称不明)	平穩		2022
59	金倉橋	町道	飯綱東弥勒線	10.0	6.8	1	PC橋	1994	その他	-	平穩		2019
60	やまびこ歩道橋	町道	黒川上川原線	82.0	2.5	3	鋼橋	1996	河川	(名称不明)	平穩		2020
61	黒川橋	町道	砂止夜間瀬線	40.0	9.8	2	鋼橋	1966	河川	横湯川	平穩		2023
62	下河童沢橋	町道	河童沢高天ヶ原線	76.0	9.2	3	鋼橋	2003	河川	(名称不明)	平穩		2021
63	発哺1号橋	町道	河童沢高天ヶ原線	11.5	11.2	1	PC橋	2003	その他	(名称不明)	平穩		2021
64	一本橋	町道	伊沢箱山線	8.0	5.1	1	RC橋	1967	河川	(名称不明)	戸狩	修繕	2021
65	胡麻田橋	町道	胡麻田線	6.6	4.2	1	鋼橋	1978	河川	(名称不明)	戸狩		2020
66	一号橋9	町道	北原一号線	2.3	10.1	1	RC橋	1997	河川	(名称不明)	佐野		2020
67	一号橋10	町道	上1号線	5.0	3.6	1	鋼橋	1973	河川	三沢川	佐野		2019
68	興隆寺橋	町道	佐野寺前線	4.5	3.1	1	RC橋	1957	河川	(名称不明)	佐野		2020
69	学林橋	町道	学林線	3.7	5.7	1	RC橋	1975	河川	(名称不明)	佐野		2020
70	薬師橋	町道	前林1号線	3.8	6.3	1	RC橋	1987	河川	三沢川	佐野		2020
71	常与橋	町道	前林2号線	3.0	2.2	1	鋼橋(木床版)	2001	河川	(名称不明)	佐野		2020
72	薬師2号橋	町道	前林3号線	5.0	2.5	1	鋼橋(木床版)	2007	河川	(名称不明)	佐野	修繕	2020
73	宮橋	町道	竹の越大坂線	6.0	2.8	1	RC橋	1981	河川	伊沢川	佐野		2023
74	西脇1号橋	町道	上野堀ノ内線	8.9	5.0	1	RC橋	1982	河川	伊沢川	寒沢		2023
75	赤向坂橋	町道	長原山ノ脇線	8.0	5.0	1	RC橋	1982	河川	伊沢川	寒沢		2023
76	新田橋	町道	新田赤向坂2号線	6.9	2.8	1	RC橋	1983	河川	(名称不明)	寒沢		2020
77	朝日橋	町道	新田朝日線	6.3	3.5	1	RC橋	1982	河川	(名称不明)	寒沢		2020
78	見王橋	町道	井沢原線	5.1	4.1	1	RC橋	1983	河川	(名称不明)	寒沢		2021
79	中ノ橋	町道	伊沢線	6.0	6.1	1	RC橋	1981	河川	伊沢川	戸狩		2021
80	長原橋	町道	新田内の町線	7.8	2.9	1	RC橋	1983	河川	(名称不明)	寒沢		2020
81	北原東跨道橋	町道	北原4号線	20.0	9.0	1	PC橋	1996	道路	(名称不明)	佐野		2020
82	穂波大橋	町道	宮下川原線	107.5	10.8	2	RC橋	1995	河川	夜間瀬川	平穩	修繕	2020
83	藤沢橋	町道	宇木藤沢線	9.1	5.1	1	RC橋	1988	河川	(名称不明)	夜間瀬		2021
84	三間松橋	町道	島西在池線	9.3	4.8	1	RC橋	1984	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022
85	孫田橋	町道	宇木前谷地線	10.0	5.1	1	PC橋	1988	河川	笹川	夜間瀬		2019
86	立道橋	町道	宇木前線	5.7	6.3	1	RC橋	1985	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022
87	泡貝橋2号橋	町道	下倉十三崖線	10.0	3.8	1	RC橋	1988	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022
88	永泉橋	町道	永泉若宮線	9.0	3.8	1	RC橋	1983	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022
89	横下橋	町道	横倉下手線	6.1	2.7	1	RC橋	1988	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022
90	上ノ沢橋	町道	土平千手寺線	7.6	4.3	1	RC橋	1983	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022


計画対象橋梁一覧表 (3/3)

NO	橋名	路線		橋長 (m)	全幅員 (m)	径間	橋梁 種別	架設年	交差物件		所在地	措置	直近 定期 点検 年次
		種別	名称										
91	中沢橋	町道	下入土平線	8.0	3.3	1	RC橋	1983	河川	笹川	夜間瀬		2023
92	沢橋	町道	仲田道陸神線	7.2	5.0	1	RC橋	1967	河川	笹川	夜間瀬		2023
93	泡貝橋 4号	町道	町3号線	8.2	4.8	1	RC橋	1981	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022
94	泡貝橋 5号	町道	塚田1号線	11.2	4.8	1	RC橋	1983	河川	(名称不明)	夜間瀬		2023
95	笹川橋	町道	若宮柳原線	7.3	7.0	1	PC橋	1983	河川	(名称不明)	夜間瀬		2022
96	清水橋 2	町道	下須池ノ平線	14.7	5.5	1	鋼橋	1983	河川	倉下川	夜間瀬		2023
97	がんどば橋	町道	中原種池線	13.0	3.5	1	鋼橋	1991	河川	倉下川	夜間瀬		2023
98	大向橋	町道	苗間大向線	11.6	4.8	1	RC橋	1976	河川	倉下川	夜間瀬		2023
99	上手橋	町道	乗廻小丸山線	10.9	6.7	1	RC橋	1983	河川	倉下川	夜間瀬		2023
100	竜王橋	町道	乗廻竜王線	19.0	7.2	1	PC橋	1999	河川	(名称不明)	乗廻		2020
101	山橋	町道	中須6号線	22.0	6.7	1	PC橋	1993	河川	倉下川	苗間		2023
102	和合橋歩道橋	町道	湯田中番場沓野線	38.0	2.1	3	鋼橋	1995	河川	横湯川	平穩	修繕	2019
103	栄橋歩道橋	町道	佐野湯田中線	85.3	2.8	5	PC橋	1979	河川	夜間瀬川	平穩	修繕	2020
104	山田橋	町道	新田下見王線	6.2	3.9	1	RC橋	1980	河川	(名称不明)	寒沢	修繕	2018
105	角間2号橋	町道 1級	宮前角間線	3.2	5.5	1	RC橋	1980	河川	(名称不明)	佐野	修繕	2021

3. 修繕等措置の着手状況



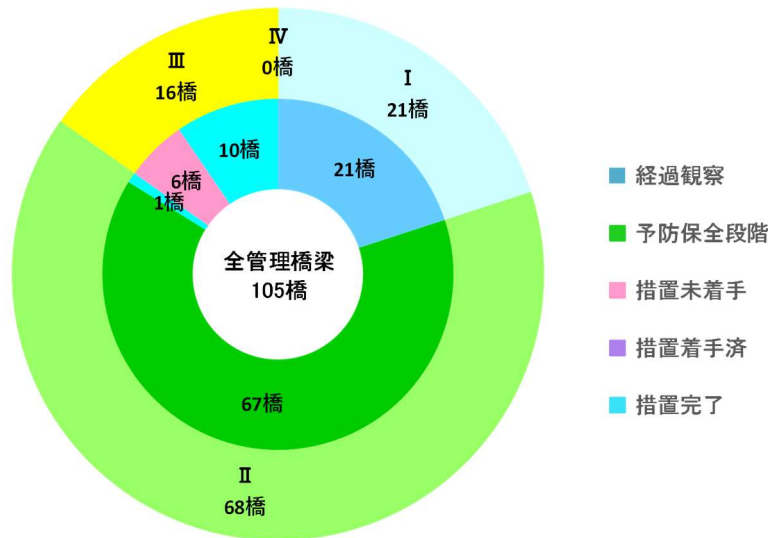

下図には、前回計画策定以降におけるメンテナンス事業の執行状況を示します。

山ノ内町では、前回点検にて早期措置段階（健全性Ⅲ）となった橋に対し、優先的かつ計画的な対策を着実に行ってきました。





以降には、修繕等措置により健全性が向上した代表事例を示します。

橋梁番号 103 栄橋歩道橋

前回定期点検 (2020年12月2日)	修繕等措置 (2022年3月竣工)
<p>【主桁】</p> <p>ひび割れから著し漏水や遊離石灰が生じているため、早期措置段階（判定区分Ⅲ）と判断。</p> 	<p>主桁のひび割れ補修（断面修復）により、健全性が回復。</p> 
<p>【橋脚】 ひび割れから著し漏水や遊離石灰が生じているため、早期措置段階（判定区分Ⅲ）と判断。</p> 	<p>橋脚のひび割れ補修により、健全性が回復。</p> 

橋梁番号 43 4号橋

前々回定期点検 (2018年10月15日)	修繕等措置 (2020年12月竣工、写真は2023年9月定期点検時に撮影)
<p>【木床版】 床版の腐朽および抜け落ちが生じている。</p> 	<p>木床版を張り替えることで、健全性が回復。</p> 



## 4. 個別施設（橋梁）管理の基本的な方針

### （1）健全度の把握及び日常的な維持管理の基本方針

#### ◆健全度の把握

管理橋梁の近接目視点検（法定点検）を5年毎に行うことで、施設の損傷状況（健全度）を把握し、診断結果を修繕計画に反映します。

#### ◆日常的な維持管理

利用者の安全性の確保や構造物を良好な状態に保つために、パトロールの実施や排水柵清掃及び舗装の軽微な修繕等の日常的な維持管理を行います。

### （2）橋梁の長寿命化及び修繕・架け替え、集約・撤去に係る費用縮減に関する基本方針

#### ◆長寿命化および修繕・架替えに係る費用の縮減に関する方針

効率的かつ合理的な維持管理を実現し、施設維持管理事業にかかるコスト縮減を目的として、予防保全型維持管理を目指します。

予防保全型の維持管理への転換を進めることで、将来にわたるライフサイクルコストを縮小化します。

#### ◆新技術の導入検討

橋梁の修繕、更新、撤去の実施にあたっては、従来工法のみでなく新工法や新材料などの新技術等を加えた比較検討を行います。

また、橋梁の点検にあたっては、費用の縮減や事業の効率化等を図るため「点検支援技術性能カタログ(案)」に記載された技術を活用することで令和10年度までの5ヶ年点検費用について約1割（4百万円）程度縮減することを目指します。

なお、令和10年度までには全橋梁のうち、約1割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる新技術等を活用することを目標とします。

#### ◆橋梁の撤去・集約の検討

施設の集約化・撤去及び機能縮小については、社会経済情勢や施設利用状況、迂回路または周辺道路の整備状況等を踏まえ、地元の意見を取入れながら検討していきます。

なお、令和10年度までに、集約が可能な橋梁については集約・撤去することで、維持管理に係る修繕等の費用を約1百万円程度縮減することを目標とします。

### (3) 老朽化対策における基本方針

#### ◆計画的な維持保全

定期点検結果に基づく「施設の健全度」と、橋梁の諸元状況や道路状況などによる施設毎の「重要性」から修繕の優先順位を検討し、計画的かつ適切な維持保全を行うことにより施設の長寿命化を図ります。

#### ◆予防的な修繕等の実施

予防的な修繕の実施を徹底することで大規模な修繕を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図ることを基本とします。

### ●維持管理体制の違い

#### 予防保全型

定期点検結果などから統計的手法（回帰分析）を用いて橋梁の劣化の進行を予測し、損傷が重大となる前に維持補修を行う管理体制です。


- ・損傷の早期発見と対処により、維持管理コストの縮減および橋梁の長寿命化を図ります。

#### 対症療法型

損傷が重大となってから維持補修を行う管理体制です。（従来型手法）

- ・損傷の晩期発見と対処により、施設寿命の短命化のおそれがあります。
- ・大規模な修繕工事または架け替えにより、工事費用が増大します。
- ・長期間に及ぶ通行規制により、道路利用者に与える影響が増大します。

・維持管理体制の違いによるコスト縮減イメージ

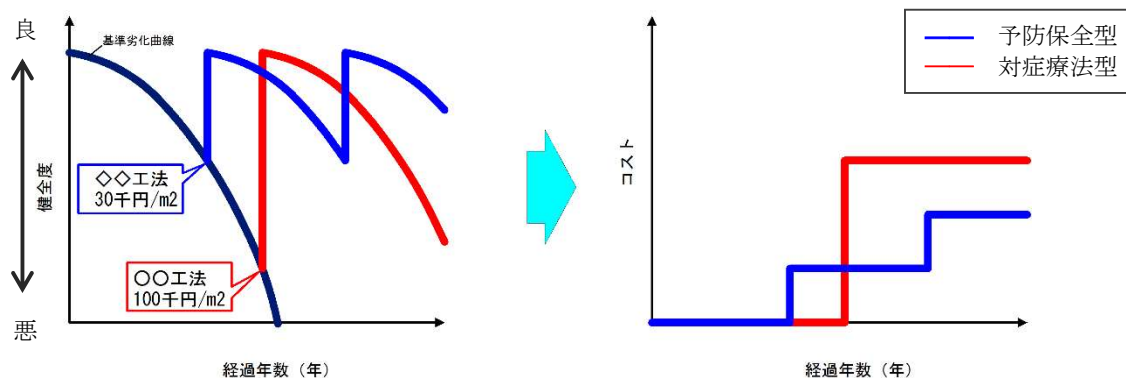

## 5. 橋の健全度の把握

### (1) 橋梁定期点検

本町では、施設の劣化・損傷状況を把握するため、「長野県 道路橋定期点検要領」を用いて定期点検を実施しました。

定期点検では、部材単位の健全性と施設毎の健全性について、次の4段階区分を用いて診断します。

橋梁定期点検 健全性の診断区分

I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く緊急に措置を講ずるべき状態。

#### ● 「長野県 道路橋定期点検要領」とは


「長野県 橋定期点検要領」は、2015年（平成27年）6月に道路法が改正され、2014年（平成26年）6月には国土交通省より作成・通知された要領に基づき、長野県建設部が整備した定期点検要領です。

以前は、橋梁点検における点検手法や健全性の評価方法などは、各自治体の判断に委ねられていましたが、これにより点検手法および健全性の評価方法の統一化が図られました。

そして、同年7月には改正道路法が施行され、5年に1回の「近接目視点検」が義務化されました。

### (2) 山ノ内町 最新定期点検結果 まとめ

点検年度	構造物毎の健全度診断				合計
	I	II	III	IV	
2018 (H30)	0	0	1	0	1
2019 (R1)	4	10	0	0	14
2020 (R2)	2	14	7	0	23
2021 (R3)	2	17	6	0	25
2022 (R4)	5	14	3	0	22
2023 (R5)	3	16	1	0	20
合計	16	71	18	0	105

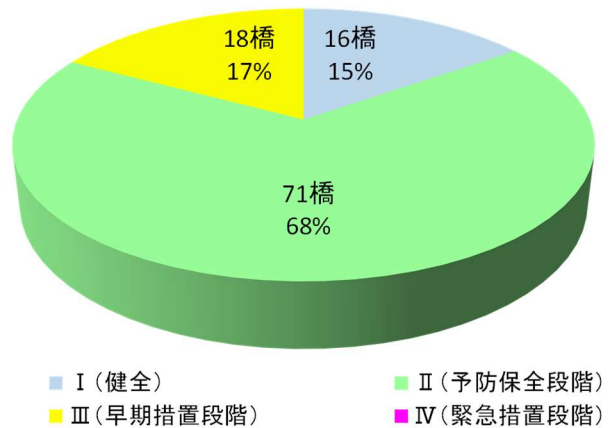

## 6. 対策の優先順位の設定

計画的に修繕・架け替えを行うため、「橋の健全度」と「橋の重要度」を用いて、対策実施の優先順位を設定します。

### ●橋の健全度と橋の重要度の評価方法

- 橋の健全度

最新の定期点検結果を基に評価します。

- 橋の重要度

各橋梁が架かる道路条件や環境条件などから評価します。

評価に用いた項目は下表のとおりです。

評価項目	評価区分	備考
緊急輸送路	該当する	
	該当しない	
迂回路の有無	無	
	有	
観光地アクセス	該当する	
	該当しない	
橋長	50m以上	
	15m以上50m未満	
	15m未満	
交差状況	鉄道・道路	
	河川・その他	

## 7. 長寿命化修繕計画による効果

今後50年間における維持管理事業費を試算した結果です。


予防保全型維持管理による既設構造物の延命化を図ることで、従来の対症療法型維持管理に比べ、51.6億円のコスト削減効果が見込めます。

●50年後の効果

対症療法型	149.5 億円
— 予防保全型	97.9 億円
<b>効果</b>	<b>51.6 億円</b>
	<b>(約 35%) ※</b>

※効果百分率の計算 = (効果) ÷ (対症療法型累計) × 100

※解析期間：2024年～2073年

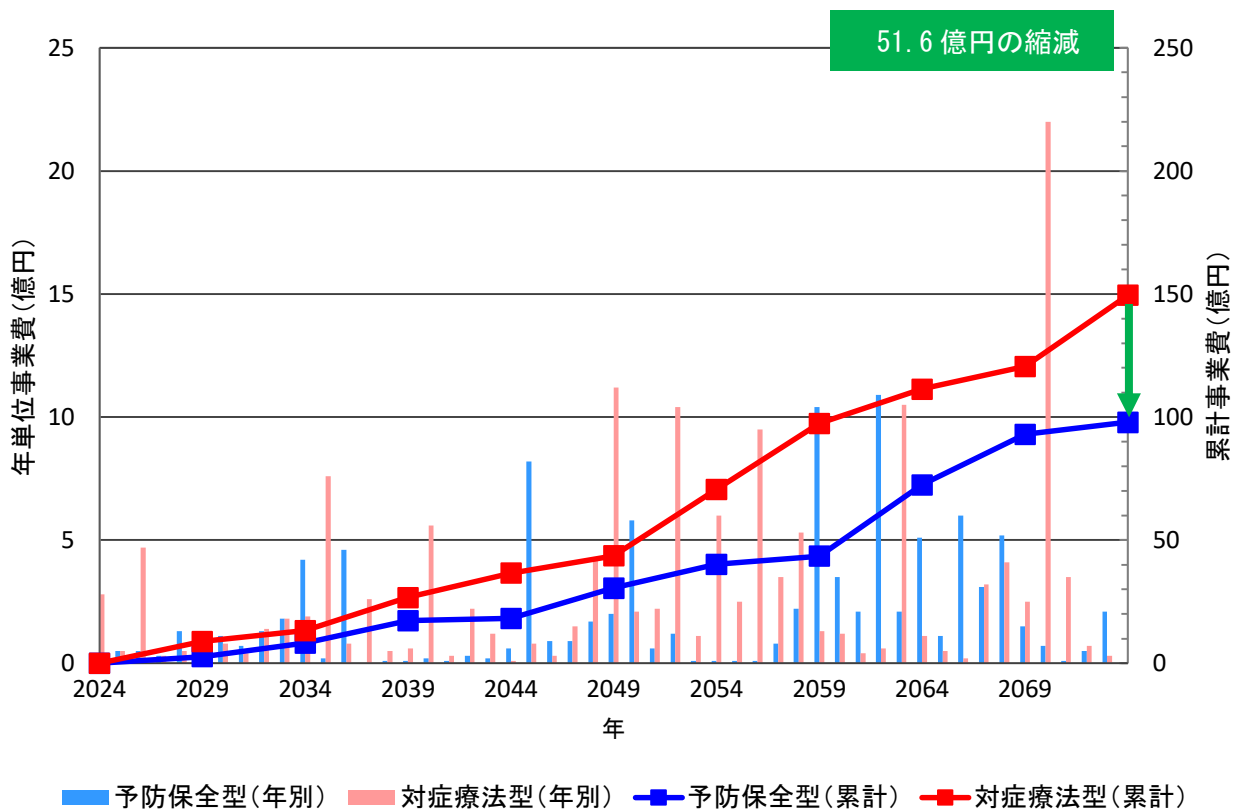

管理橋梁の対策時期

※対策内容は計画初年度より直近5年分を示します。  
 ※表中の橋梁は、優先順位が高い順に並べています。  
 ※橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

橋梁の健全性の診断区分				
I判定 (健全)	II判定 (予防保全段階)	III判定 (早期措置段階)	IV判定 (緊急措置段階)	

No.	整理番号	橋梁名	路線名称	橋長(m)	幅員(m)	架設年	交差条件	次回定期点検	最新定期点検		直近点検後の措置状況	対策内容・時期・工事費(千円)				
									実施年度	判定		R6	R7	R8	R9	R10
												2024	2025	2026	2027	2028
											34,854	69,333	70,901	40,916	71,146	
82	082	穂波大橋	宮下川原線	107.5	10.8	1995	河川	2025	2020	III	補修済R3	点検				
20	020	栄橋	佐野湯田中線	85.3	6.2	1960	河川	2024	2020	III	一部補修済R1	点検	補修			
100	100	竜王橋	乗廻竜王線	19.0	7.2	1999	河川	2025	2020	III		設計	点検		補修	
104	104	山田橋	新田下見王線	6.2	3.9	1980	河川	2024	2018	III	補修済R5	点検				
6	006	天神橋	伊沢三社線	106.8	8.3	1974	河川	2025	2020	III			点検		補修	
39	039	沢尻橋	平床石ノ湯線	5.2	5.4	1991	河川	2027	2022	III		設計	補修		点検	
12	012	天川橋	横湯天川線	29.4	7.6	1977	河川	2026	2021	III				点検	補修	
														設計		
5	005	伊沢大橋	伊沢三社線	7.3	5.1	1975	河川	2025	2020	III		設計	点検	補修		
62	062	下河重沢橋	河重沢高天ヶ原線	76.0	9.2	2003	河川	2027	2021	III				補修	点検	
105	105	角間2号橋	宮前角間線	3.2	5.5	1980	河川	2026	2021	III	補修済R5			点検		
24	024	かくら橋	天神森林橋線	11.7	5.3	1978	河川	2025	2021	III			点検	設計	補修	
64	064	一本橋	伊沢箱山線	8.0	5.1	1967	河川	2026	2021	III	補修済R5			点検		
49	049	11号橋	硯川清水線	5.0	1.9	2000	河川	2027	2022	III		設計			点検	
												補修				
103	103	栄橋歩道橋	佐野湯田中線	85.3	2.8	1979	河川	2024	2020	III	補修済R4	点検				
23	023	堀橋	宇木深沢線	4.7	5.2	1964	河川	2025	2021	III			点検	設計	補修	
53	053	15号橋	硯川清水線	3.1	1.5	1991	河川	2028	2023	III					設計	点検
															補修	
50	050	12号橋	硯川清水線	5.6	1.9	1991	河川	2027	2022	III		設計			点検	
												補修				
72	072	薬師2号橋	前林3号線	5.0	2.5	2007	河川	2025	2020	III	補修済R2		点検			
9	009	下手橋	中須下手乗廻線	25.6	7.5	1992	河川	2025	2020	II			点検			
26	026	高井富士橋	柏木立がんどう場線	16.5	8.2	1995	河川	2026	2021	II				点検		
37	037	洪湯橋	洪湯1号線	35.6	10.8	1965	河川	2024	2019	II		点検				
18	018	和合橋	湯田中番場沓野線	34.9	6.3	1949	河川	2024	2019	II		点検				
81	081	北原東跨道橋	北原4号線	20.0	9.0	1996	道路	2025	2020	II			点検			
1	001	角間橋	宮前角間線	78.3	8.8	1977	河川	2024	2019	II		点検				
13	013	一の沢橋	横湯地獄谷線	20.5	6.7	1981	河川	2026	2021	II				点検		
14	014	2号橋2	横湯地獄谷線	21.9	6.9	1981	河川	2026	2021	II				点検		
28	028	下白沢橋	表落合池ノ平線	33.2	6.2	1977	河川	2024	2019	II	補修済R1	点検				
2	002	角間跨道橋	宮前角間線	23.5	11.0	1995	道路	2026	2021	II				点検		
27	027	中河原橋	中須八丁原線	16.6	4.7	1988	河川	2026	2021	II				点検		
25	025	不動橋	苗間乗廻線	14.5	8.5	1993	河川	2026	2021	II				点検		
16	016	二の沢橋	横湯地獄谷線	6.8	4.8	1975	河川	2026	2021	II				点検		
15	015	1号橋2	横湯地獄谷線	2.6	4.6	1975	道路	2026	2021	II				点検		
69	069	学林橋	学林線	3.7	5.7	1975	河川	2025	2020	II			点検			
3	003	1号橋1	湯田中番場沓野線	10.8	7.4	1973	河川	2026	2021	II				点検		
85	085	孫田橋	宇木前谷地線	10.0	5.1	1988	河川	2024	2019	II		点検				
67	067	一号橋10	上1号線	5.0	3.6	1973	河川	2024	2019	II		点検				
4	004	2号橋1	湯田中夜間瀬線	4.2	10.7	2002	河川	2028	2023	II					点検	
29	029	倉下橋	表落合池ノ平線	15.2	5.0	1982	河川	2026	2021	II				点検		
102	102	和合橋歩道橋	湯田中番場沓野線	38.0	2.1	1995	河川	2024	2019	II	補修済R1	点検				
95	095	笹川橋	若宮柳原線	7.3	7.0	1983	河川	2027	2022	II					点検	
7	007	箱山橋	原箱山線	6.8	5.0	1959	河川	2024	2019	II		点検				
61	061	黒川橋	砂止夜間瀬線	40.0	9.8	1966	河川	2028	2023	II					点検	
11	011	川原小屋橋	旭山発咄線	13.3	5.2	1994	河川	2026	2021	II				点検		
17	017	榎沢橋	金倉安代線	8.9	4.5	1972	河川	2026	2021	II				点検		
93	093	泡貝橋4号	町3号線	8.2	4.8	1981	河川	2027	2022	II					点検	
90	090	上ノ沢橋	土平千手寺線	7.6	4.3	1983	河川	2027	2022	II					点検	

管理橋梁の対策時期

※対策内容は計画初年度より直近5年分を示します。  
 ※表中の橋梁は、優先順位が高い順に並べています。  
 ※橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

橋毎の健全性の診断区分				
I判定 (健全)	II判定 (予防保全段階)	III判定 (早期措置段階)	IV判定 (緊急措置段階)	

No.	整理番号	橋梁名	路線名称	橋長(m)	幅員(m)	架設年	交差条件	次回定期点検	最新定期点検		直近点検後の措置状況	対策内容・時期・工事費(千円)				
									実施年度	判定		R6	R7	R8	R9	R10
												2024	2025	2026	2027	2028
												34,854	69,333	70,901	40,916	71,146
65	065	胡麻田橋	胡麻田線	6.6	4.2	1978	河川	2025	2020	II			点検			
36	036	安代橋	安代和合橋線	5.5	5.1	1961	河川	2026	2021	II				点検		
34	034	2号橋3	湯の原1号線	2.1	5.8	1973	その他	2024	2019	II		点検				
60	060	やまびこ歩道橋	黒川上川原線	82.0	2.5	1996	河川	2025	2020	II			点検			
10	010	向村橋	向村竹の腰線	12.0	5.4	1982	河川	2025	2020	II			点検			
33	033	1号橋7	湯の原1号線	2.3	5.4	1973	その他	2024	2019	II		点検				
98	098	大向橋	苗間大向線	11.6	4.8	1976	河川	2028	2023	II						点検
94	094	泡貝橋5号	塚田1号線	11.2	4.8	1983	河川	2028	2023	II						点検
87	087	泡貝橋2号橋	下倉十三屋線	10.0	3.8	1988	河川	2027	2022	II					点検	
79	079	中ノ橋	伊沢線	6.0	6.1	1981	河川	2026	2021	II				点検		
70	070	薬師橋	前林1号線	3.8	6.3	1987	河川	2025	2020	II			点検			
19	019	1号橋3	湯田中夜間瀬線	2.0	12.0	1973	その他	2028	2023	II						点検
96	096	清水橋2	下須池ノ平線	14.7	5.5	1983	河川	2028	最新	II						点検
97	097	がんどば橋	中原種池線	13.0	3.5	1991	河川	2028	2023	II						点検
55	055	17号橋	硯川清水線	8.0	2.0	2000	河川	2027	2022	II						点検
48	048	10号橋	硯川清水線	7.5	2.0	2000	河川	2028	2023	II						点検
41	041	2号橋4	硯川清水線	6.9	1.7	1984	河川	2027	2022	II						点検
52	052	14号橋	硯川清水線	5.5	2.0	2000	河川	2027	2022	II						点検
47	047	9号橋	硯川清水線	4.9	1.7	1991	河川	2027	2022	II						点検
101	101	山橋	中須6号線	22.0	6.7	1993	河川	2028	2023	II						点検
54	054	赤石橋	硯川清水線	16.4	2.0	1971	河川	2027	2022	II						点検
57	057	19号橋	硯川清水線	11.5	1.9	2000	その他	2027	2022	II						点検
99	099	上手橋	乗廻小丸山線	10.9	6.7	1983	河川	2028	2023	II						点検
51	051	13号橋	硯川清水線	10.1	1.6	2000	河川	2027	2022	II						点検
38	038	地獄橋	上林地獄谷線	9.7	1.5	2000	河川	2026	2021	II				点検		
83	083	藤沢橋	宇木藤沢線	9.1	5.1	1988	河川	2026	2021	II				点検		
74	074	西脇1号橋	上野堀ノ内線	8.9	5.0	1982	河川	2028	2023	II						点検
8	008	大坂橋	大日堂大坂線	8.0	3.8	1982	河川	2028	2023	II						点検
75	075	赤向坂橋	長原山ノ脇線	8.0	5.0	1982	河川	2028	2023	II						点検
80	080	長原橋	新田内の町線	7.8	2.9	1983	河川	2025	2020	II			点検			
92	092	沢橋	仲田道陸神線	7.2	5.0	1967	河川	2028	2023	II						点検
73	073	宮橋	竹の越大坂線	6.0	2.8	1981	河川	2028	2023	II						点検
86	086	立道橋	宇木前線	5.7	6.3	1985	河川	2027	2022	II						点検
68	068	興隆寺橋	佐野寺前線	4.5	3.1	1957	河川	2025	2020	II			点検			
71	071	常与橋	前林2号線	3.0	2.2	2001	河川	2025	2020	II			点検			
66	066	一号橋9	北原一号线	2.3	10.1	1997	河川	2025	2020	II			点検			
35	035	1号橋8	湯の原2号線	2.1	4.5	1974	河川	2026	2021	II				点検		
88	088	永泉橋	永泉若宮線	9.0	3.8	1983	河川	2027	2022	II						点検
21	021	泡貝橋1号	本郷宇木前坂大廻線	7.7	5.5	1984	河川	2025	2020	II			点検			
76	076	新田橋	新田赤向坂2号線	6.9	2.8	1983	河川	2025	2020	II			点検			
22	022	下倉橋	本郷宇木前坂大廻線	5.6	8.4	1995	河川	2025	2020	II			点検			
58	058	清水橋	硯川清水線	8.0	1.8	2005	河川	2027	2022	II						点検
91	091	中沢橋	下入土平線	8.0	3.3	1983	河川	2028	2023	II						点検
40	040	笠見橋	熊の湯山田線	21.0	6.6	2019	河川	2025	2020	I	補修済 R2		点検			
59	059	金倉橋	飯綱東弥勒線	10.0	6.8	1994	その他	2024	2019	I		点検				
63	063	発咄1号橋	河童沢高天ヶ原線	11.5	11.2	2003	その他	2026	2021	I				点検		
32	032	1号橋6	上原川原線	3.1	4.1	1999	その他	2024	2019	I		点検				
30	030	1号橋4	下手向井線	2.2	3.8	1979	その他	2024	2019	I		点検				
31	031	1号橋5	西村線	2.2	3.8	1973	その他	2024	2019	I		点検				
84	084	三間松橋	島西在池線	9.3	4.8	1984	河川	2027	2022	I						点検

**管理橋梁の対策時期**

※対策内容は計画初年度より直近5年分を示します。  
 ※表中の橋梁は、優先順位が高い順に並べています。  
 ※橋梁定期点検は5年に1回実施する法定点検です。

橋梁の健全性の診断区分	
I判定 (健全)	
II判定 (予防保全段階)	
III判定 (早期措置段階)	
IV判定 (緊急措置段階)	

No.	整理番号	橋梁名	路線名称	橋長(m)	幅員(m)	架設年	交差条件	次回定期点検	最新定期点検		直近点検後の措置状況	対策内容・時期・工事費(千円)							
									実施年度	判定		R6		R7		R8		R9	
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												34,854	69,333	70,901	40,916	71,146			
77	077	朝日橋	新田朝日線	6.3	3.5	1982	河川	2025	2020	I			点検						
89	089	横下橋	横倉下手線	6.1	2.7	1988	河川	2027	2022	I					点検				
78	078	見王橋	井沢原線	5.1	4.1	1983	河川	2026	2021	I			点検						
56	056	18号橋	硯川清水線	13.5	1.6	2000	その他	2027	2022	I					点検				
46	046	8号橋	硯川清水線	11.5	2.0	2021	河川	2027	2022	I	補修済R3				点検				
42	042	3号橋	硯川清水線	8.0	1.9	2020	河川	2028	2023	I	補修済R2					点検			
43	043	4号橋	硯川清水線	8.0	1.9	2020	河川	2028	2023	I	補修済R2					点検			
44	044	5号橋	硯川清水線	7.0	1.9	2020	河川	2027	2022	I	補修済R2				点検				
45	045	6号橋	硯川清水線	6.0	1.9	2020	河川	2028	2023	I	補修済R2					点検			
